

## 久慈湊小学校移転改築事業 工事進捗状況（令和8年3月）

### ■現状説明

○建築工事は「基礎工事」を進めています。


- ・新校舎の東側から配筋作業やコンクリート打設、埋戻し等を施工しています。  
なお、基礎工事の完了時期を3月末と予定していましたが、4月末に延びる予定です。

○造成工事は「JR線路側の工事」を進めています。

- ・線路付近の地盤改良、路体盛土等を施工しました。

### ■敷地イメージ図

↑ 岩手県立久慈病院

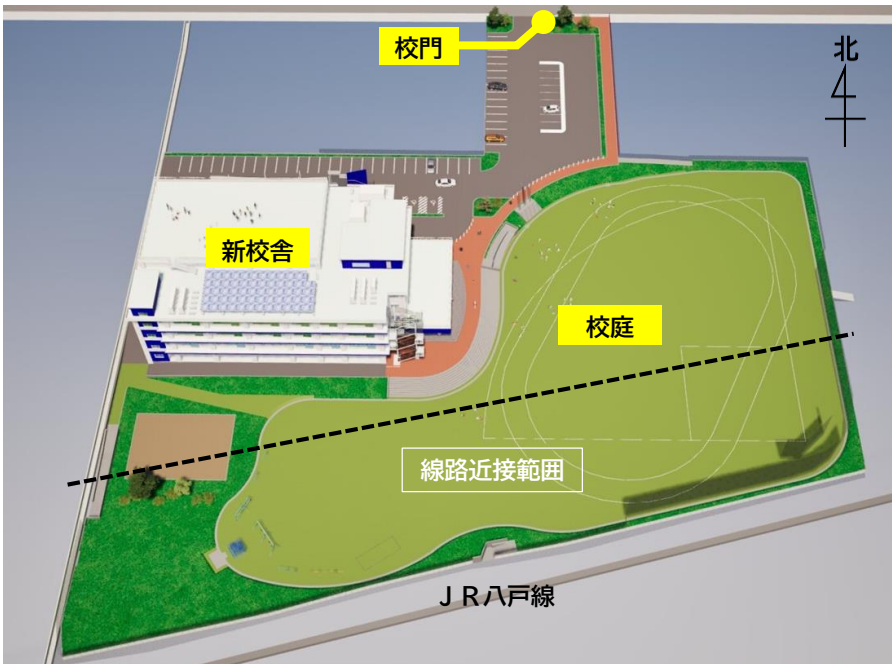

○基礎工事（埋戻し）



○線路付近

### ■敷地航空写真

