

# 久慈湊小学校移転改築事業 保護者説明会



## ■次 第

- 1.開会
- 2.教育長あいさつ
- 3.出席者紹介
- 4.移転改築事業の進捗状況について
  - (1)開校の延期について
  - (2)工事の進捗状況と  
新校舎等の概要について
- 5.質疑応答
- 6.閉会

令和8年9月16日

久慈市教育委員会事務局 学校建設推進室


○開校の延期について（変更後の開校予定）

【開校予定】

令和9年4月 ▶ 令和 **9**年 **8**月


| 主な内容                                          | 令和7年度 | 令和 <b>8</b> 年度                  | 令和9年度         |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| <b>1 学校建築工事</b>                               |       | ～2月迄                            |               |
|                                               |       | ～7月迄                            | ☆ <b>8月開校</b> |
|                                               |       | ◎ 校舎基礎工事の遅れ<br>○ 人手不足による工程調整の難航 |               |
| <b>2 造成・外構工事</b><br>(擁壁、雨水排水、フェンス、<br>グラウンド等) |       | ～3月迄                            |               |
|                                               |       | ～9月迄                            |               |
|                                               |       | ○学校建築工事の遅れに合わせた工期見直し            |               |

# ○開校の延期について（地下水圧による盤膨れ）

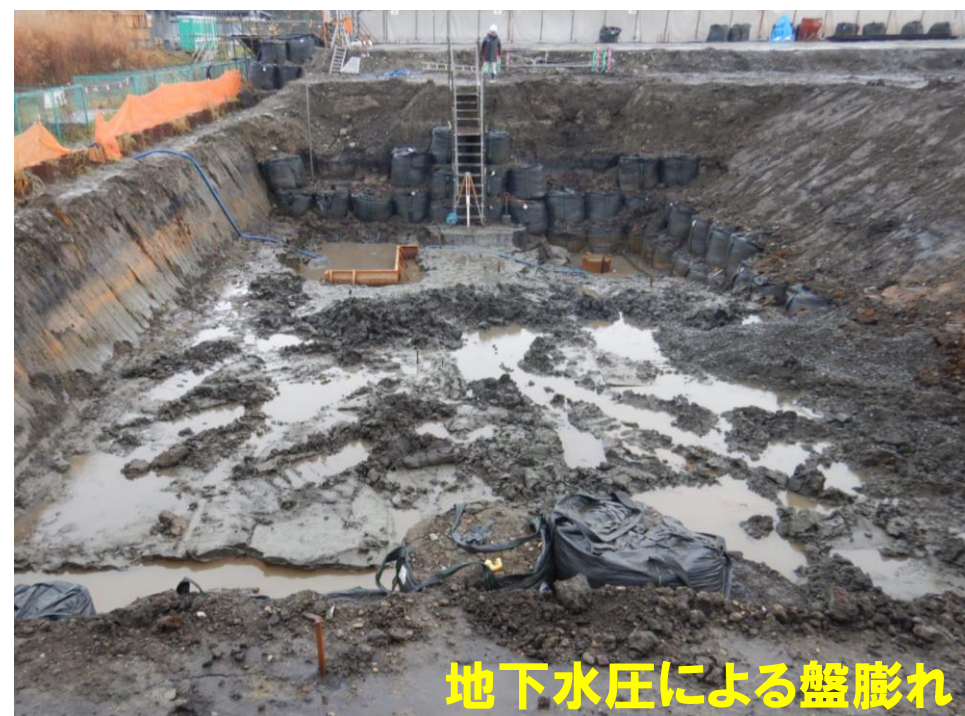

砕石敷き → コンクリート

# ○開校の延期について（施工順序の変更）

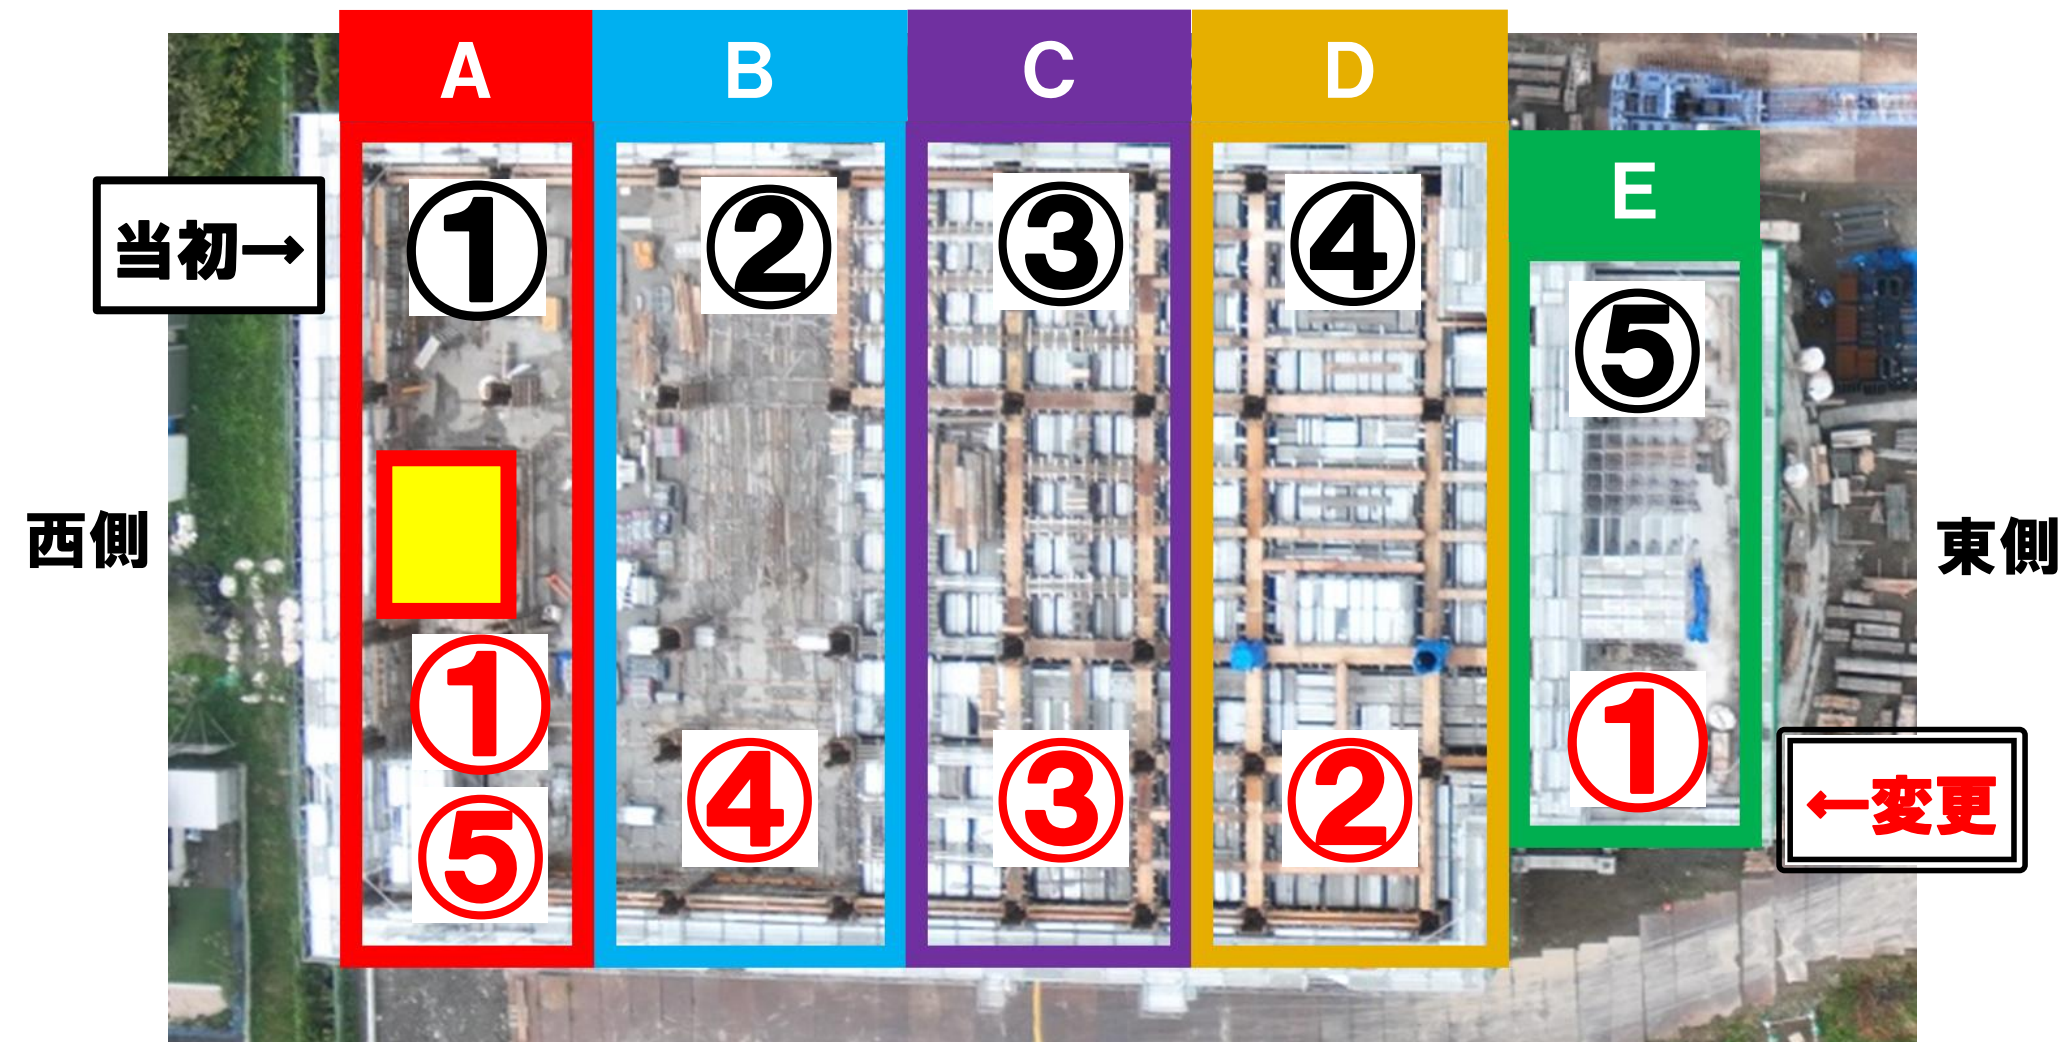

# 【参考：基礎工事の主な工程】



# ○開校の延期について（校舎基礎工事の遅れ）

|    | 昨年度(令和7年度)  |        |          |          |          |                                                                                      | 今年度(令和8年度)                                                                            |    |    |    |    |     |
|----|-------------|--------|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|-----|
|    | 10月         | 11月    | 12月      | 1月       | 2月       | 3月                                                                                   | 4月                                                                                    | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月～ |
| 当初 | 基礎工事（～3月下旬） |        |          |          |          |                                                                                      | 地上部の工事（4月～）                                                                           |    |    |    |    |     |
| 変更 | 基礎工事（～5月上旬） |        |          |          |          |                                                                                      | 地上部の工事（5月下旬～）                                                                         |    |    |    |    |     |
|    | ▼地盤掘削の開始    | ▼盤膨れ発生 | ▼施工順序の変更 | ▼対策工事の開始 | ▼対策工事の完了 |  |  |    |    |    |    |     |

# ○工事の進捗状況(航空写真 令和8年8月末)





# ○新校舎等の概要について(外観パース)

東面（昇降口）




屋上





北面（久慈病院側）



南面（J R線路側）

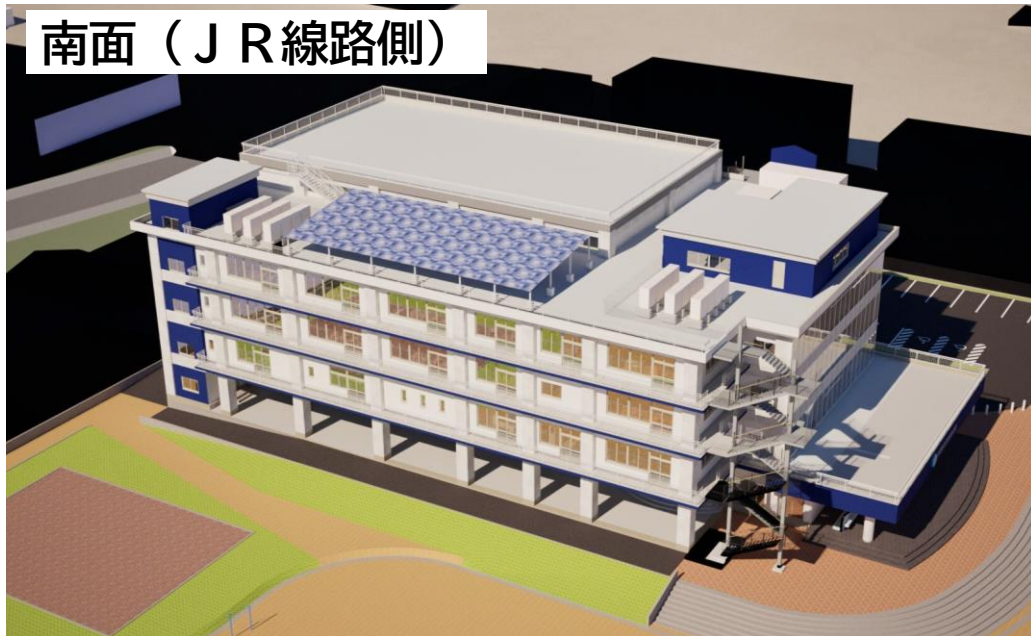

# ○新校舎等の概要について(1階 平面図)

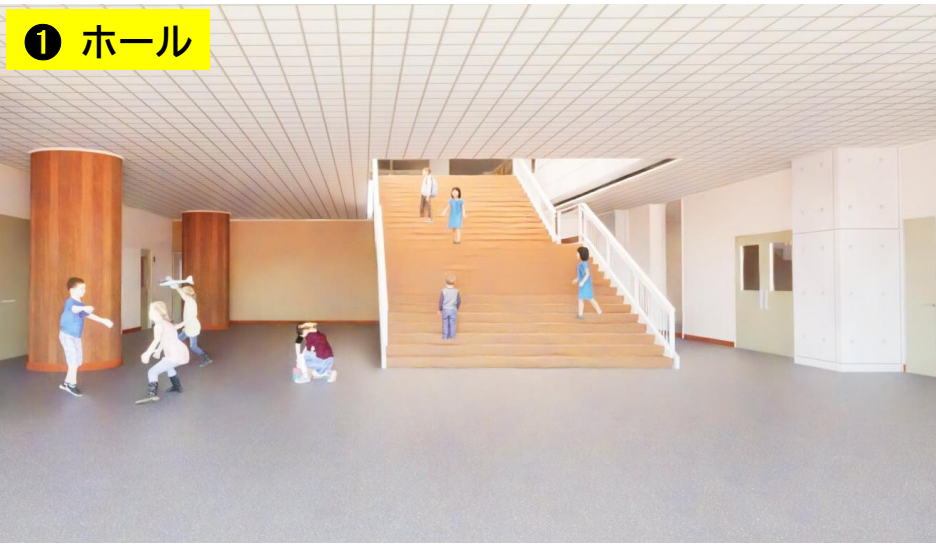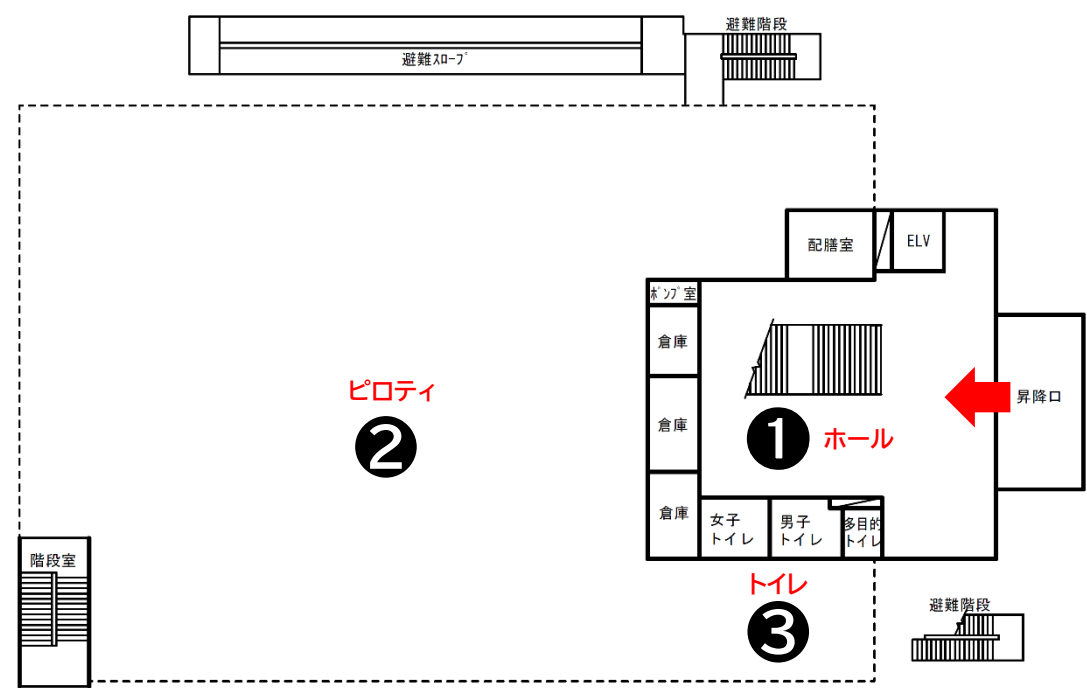

- ① ホールには、児童作品の展示や地域の情報などが掲示できます。
- ② 高さ4mほどのピロティは、雨天等にちょっとした運動スペースとしても活用できます。
- ③ トイレは校舎外からも利用可能です。

# ○新校舎等の概要について(2階 平面図)



①メディアセンター



ホール




③バルコニー

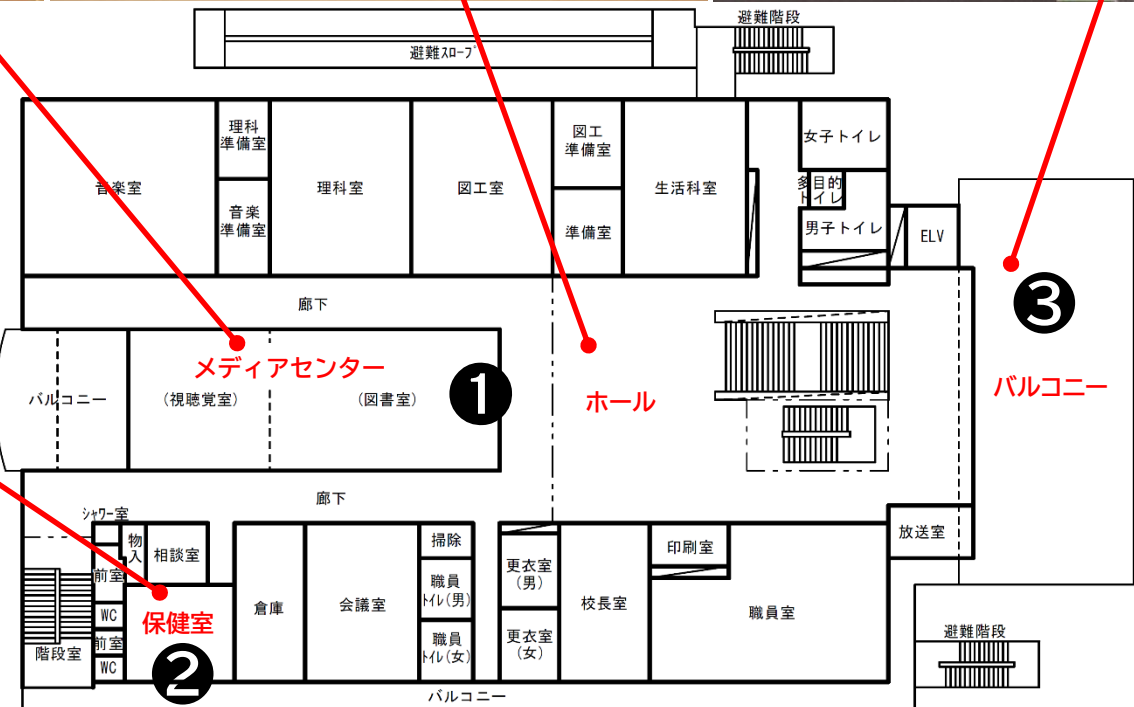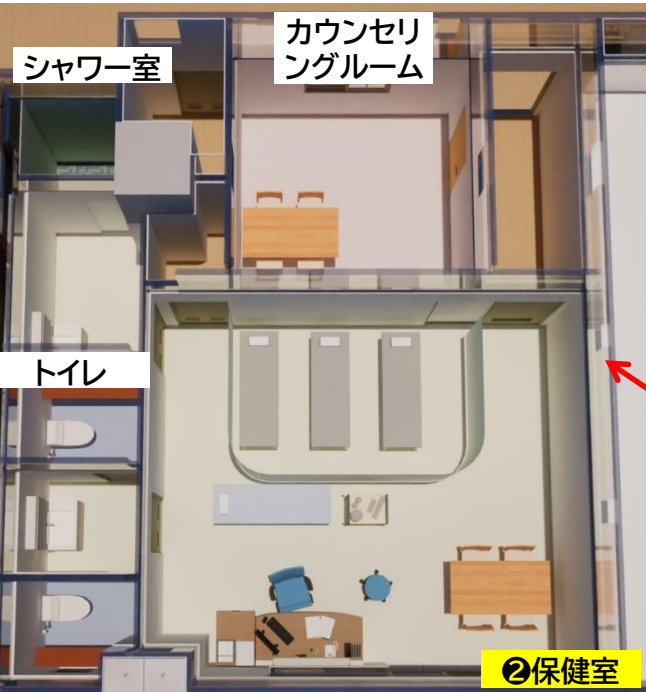



- ① メディアセンター（図書室＋視聴覚室）は、明るく開放感のあるホールと一体的に利用できます。
- ② 保健室には、カウンセリングルーム/トイレ/シャワー室等を設け、児童の色々な悩みに対応します。
- ③ バルコニーは、運動会等の観覧席としても利用できます。

○新校舎等の概要について(3、4階 平面図)

【3F】

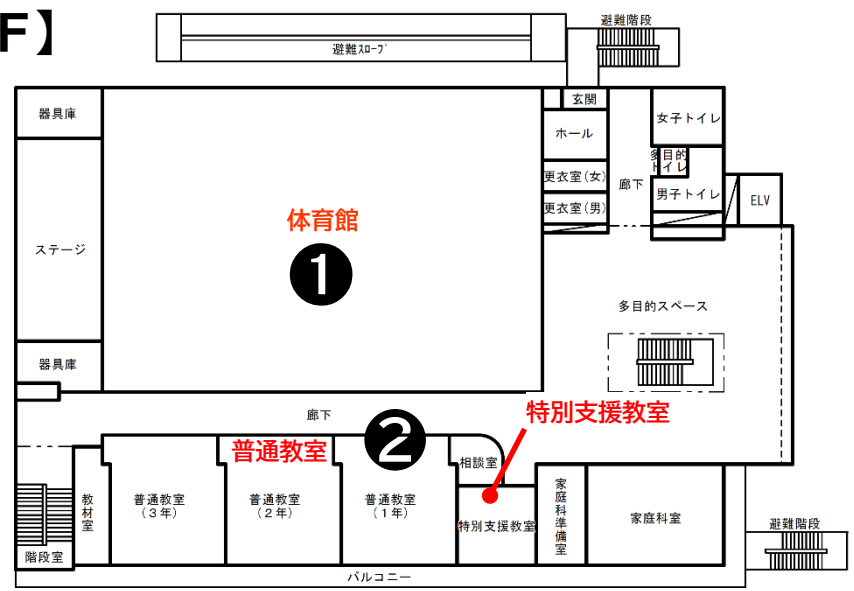

【4F】

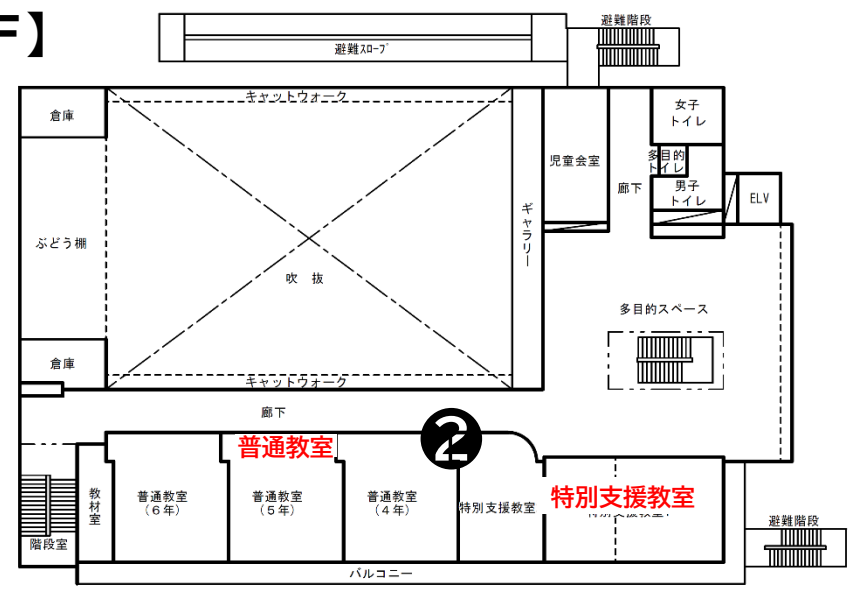

- ① 校舎3階に体育館を整備します。
- ② 普通教室は、近年の教育環境に合わせ十分な広さを確保します。

