

久慈湊小学校 移転改築ニュース（令和8年9月）

新校舎の開校を「令和9年8月」に延期します

来年（令和9年）4月開校を目指し、新校舎の建設を進めてきましたが、基礎工事の遅れ等による工程の見直しを行い、開校予定を夏休み明けの「**来年8月**」に延期します。

新校舎での学びを心待ちにされている児童や園児の皆さん、そしてご準備を進められている保護者の皆様には、ご心配とご不便をおかけしますが、子どもたちにとってより良い教育環境と、地域に親しまれる安全な学校づくりに向け、引き続き取り組んでまいりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。

▼ 延期の理由

盤膨れ（地下水で地面が押し上げられる現象）で新校舎の基礎工事が遅れ、工程を見直しましたが、全国的な建設業の人手不足は、久慈・八戸管内でも同様で、新たな工程案に合わせた作業員の手配が難航したため、工期を延長します。

新校舎の建築工事は、来年7月ごろまで行う予定です。

▼ 引越し作業と開校後の工事

- ・新校舎への引越しは、夏休み期間中に行います。
- ・グラウンドや排水などを整備する造成・外構工事の完了は、新校舎完成後の来年9月ごろを予定しています。現在の校舎で1学期を過ごすため、遊具や記念碑などの移設作業を夏休みに行う必要があるなどが理由です。
- ・登下校や学校生活に支障が出ないように、工事エリアを適切に区切り、安全を確保しながら進めます。
- ・現在の校舎は、老朽化や津波安全対策のため、解体を前提とした国の補助金を活用し移転改築を進めています。このため、引越し後に現在の校舎を解体する予定としています。


主な内容	令和7年度	令和8年度	令和9年度
1 学校建築工事		～2月迄 ～7月迄 ☆8月開校	
		○ 基礎工事の遅れ ○ 型枠工など、人手不足による工程調整	
2 造成・外構工事 (擁壁、雨水排水、 フェンス、グラウンド等)		～3月迄 ～9月迄	
		○ 学校建築工事の遅れに合わせた工期見直し	

【工事スケジュール 上段（水色）：変更前、下段（赤）：変更後】



【←↑新校舎の外観イメージ図】

工事進捗について

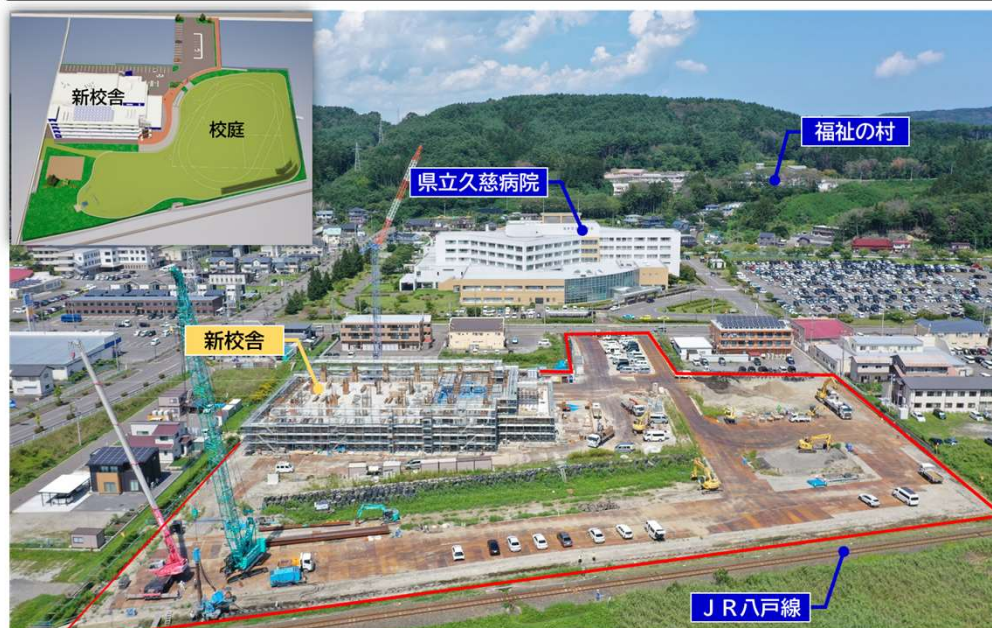

▼ 建築工事

これまでに建物を支える基礎杭の施工や、1階部分の骨組み、コンクリート打設が完了しました。現在は、2階部分のコンクリート打設に向けて、鉄筋の組み立てや型枠作業を進めています。

▼ 造成工事

盛土による土の重みで、線路が歪むのを防ぐため、JR八戸線沿いに長さ24メートルの鉄の板（鋼矢板）を横一列に打ち込みました。また、敷地外周の側溝据え付けや、擁壁の設置作業を進めています。

【お問い合わせ】

久慈市教育委員会事務局 学校建設推進室
電話：0194-52-1525（室直通）
メール：gakuji@city.kuji.iwate.jp

久慈市ホームページ
「久慈湊小学校移転
改築事業について」

